

(仮称)宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業 施設建設工事「令和元年8月度」 工事進捗状況報告書


工事概要

工 事 名	(仮称)宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業 施設建設工事			
工 事 場 所	京都府宮津市字須津、与謝野町字石川地内			
工 期	平成28年 4月22日～令和2年 6月30日			
請 負 者	タクマ・金下特定建設共同企業体			
現 場 代 理 人	木村 尊博 (土木建築 責任者：近藤 克信)			
現 場 事 務 所	〒629－2251 京都府宮津市字須津小字大谷10003-4他			
T E L	(株)タクマ	0772－45－1732	金下建設(株)	0772－45－1730
F A X		0772－45－1733		0772－45－1731

工事進捗状況

令和元年8月度の現場の作業状況は以下の通りです。		
8/1～8/31	[ごみピットエリア 躯体工事]	CG階 配筋・型枠～Con打設(～中間梁)。配筋・型枠建込(中間梁～)。
8/1～8/31	[各エリア 内装工事]	内装壁・天井下地組～ボード貼。硝子マット貼。
8/1～8/31	[各エリア 吹付工事]	各エリア：外壁吹付・塗装。
8/1～8/31	[各エリア 建具工事]	各所：鋼製建具、硝子、シャッター取付。
8/1～8/31	[各エリア 左官工事]	各所：Con打放し面が埋、目地払い、吹付下地補修。
8/1～8/31	[各エリア 塗装工事]	各所：鉄部塗装。
8/1～8/31	[メタン発酵槽 基礎工事]	基礎掘削～配筋・型枠～ベースCon打設。
8/1～8/31	[外構 埋設配管]	北側 電気幹線・設備排水埋設配管。
8/26～8/31	[外構 防火水槽]	防火水槽掘削～据付。
8/1～8/31	[電気・機械設備工事]	各エリア：電気配線、給排水配管、消火配管。
【8月末現在出来高（建築）：83.0% （全体）：61.8%】		

状況写真撮影方向（令和元年8月26日撮影）

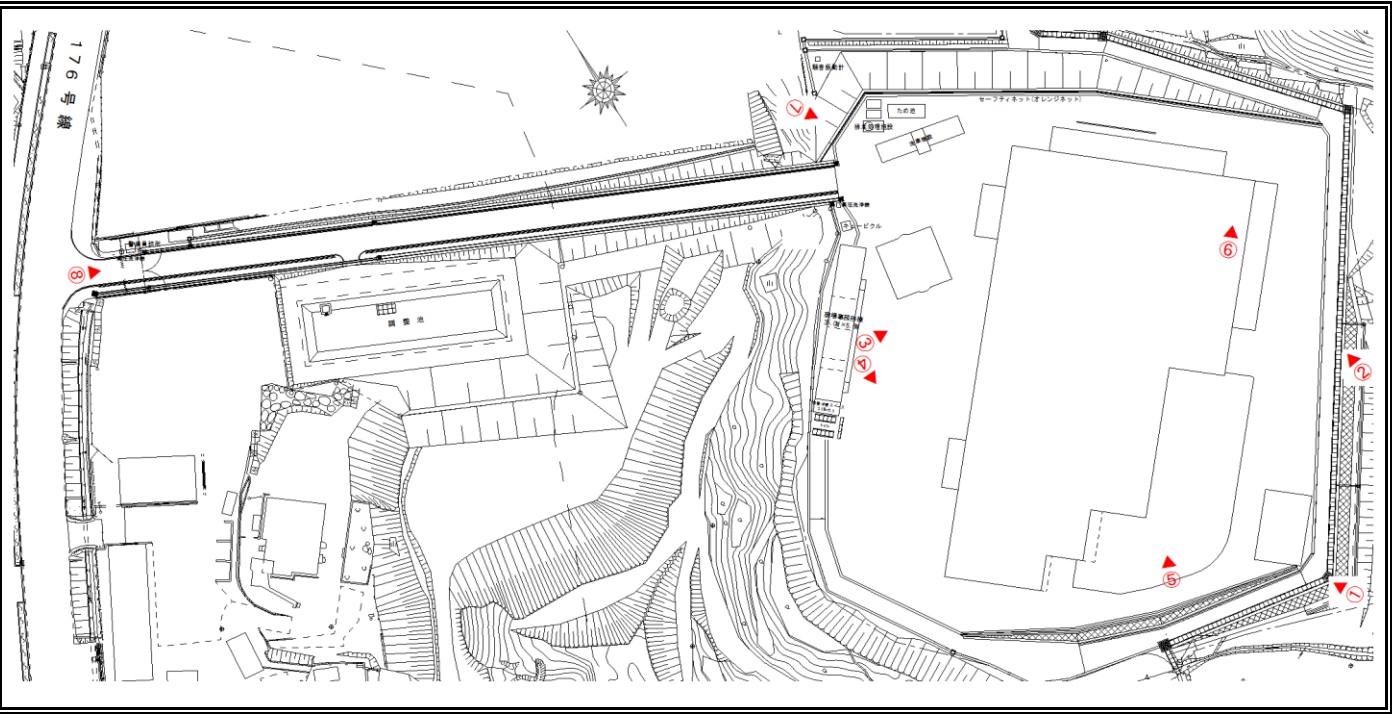

写真① 炉室・ごみピット・プラットフォームエリア(南角から)



写真② プラットホーム・リサイクルエリア(南東から)



写真③ リサイクル～ごみピットエリア(北西から)



写真④ プラットホーム・ごみピット・炉室エリア(北西から)



写真⑤ メタン発酵槽ガス貯留装置 基礎配筋



写真⑥ リサイクルエリア 内装硝子マット貼



写真⑦ 進入路(現場側)ヤード全景



写真⑧ 進入路ゲート・騒音振動計

(仮称)宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業 施設建設工事「令和元年8月度」プラント工事工事進捗状況報告書


工事概要

工 事 名	(仮称)宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業 施設建設工事
工 事 場 所	京都府宮津市字須津、与謝野町字石川地内
工 期	平成28年 4月22日～令和2年 6月30日
請 負 者	タクマ・金下特定建設共同企業体
現 場 代 理 人	木村 尊博 （プラント担当者：岡井裕之）
施 設 規 模	エネルギー回収型廃棄物処理施設（ごみ焼却施設+メタンガス化施設）
	ごみ焼却施設：30トン/24h メタンガス化施設：20.6トン/24h
	マテリアルリサイクル推進施設：14.9トン/5h

工事進捗状況

令和元年8月度の現場の作業状況は以下の通りです。		
8/1～8/31	[エネ回収（炉室）]	架台・歩廊組立、機器据付(4FL～4FL+6100)、ダクト組立
8/24～8/28	[エネ回収（ホッパエリア）]	仕舞板溶接
8/28	[エネ回収（バケット搬出場）]	機器据付(1FL)
8/1～8/31	配管工事	エネ回収（B2FL～1FL）・リサ（B1FL～1FL）・プラットホーム
		サポート・配管敷設
8/1～8/31	電気工事	エネ回収（1FL～2FL）・リサ（1FL～2FL）・プラットホーム
		ケーブルラック・電線管取付、各所現操盤・計装機器取付
		リサ（1FL～2FL）ケーブル敷設
【8月末現在出来高（プラント）：40.5 % （全体）：61.8%】		

状況写真撮影位置

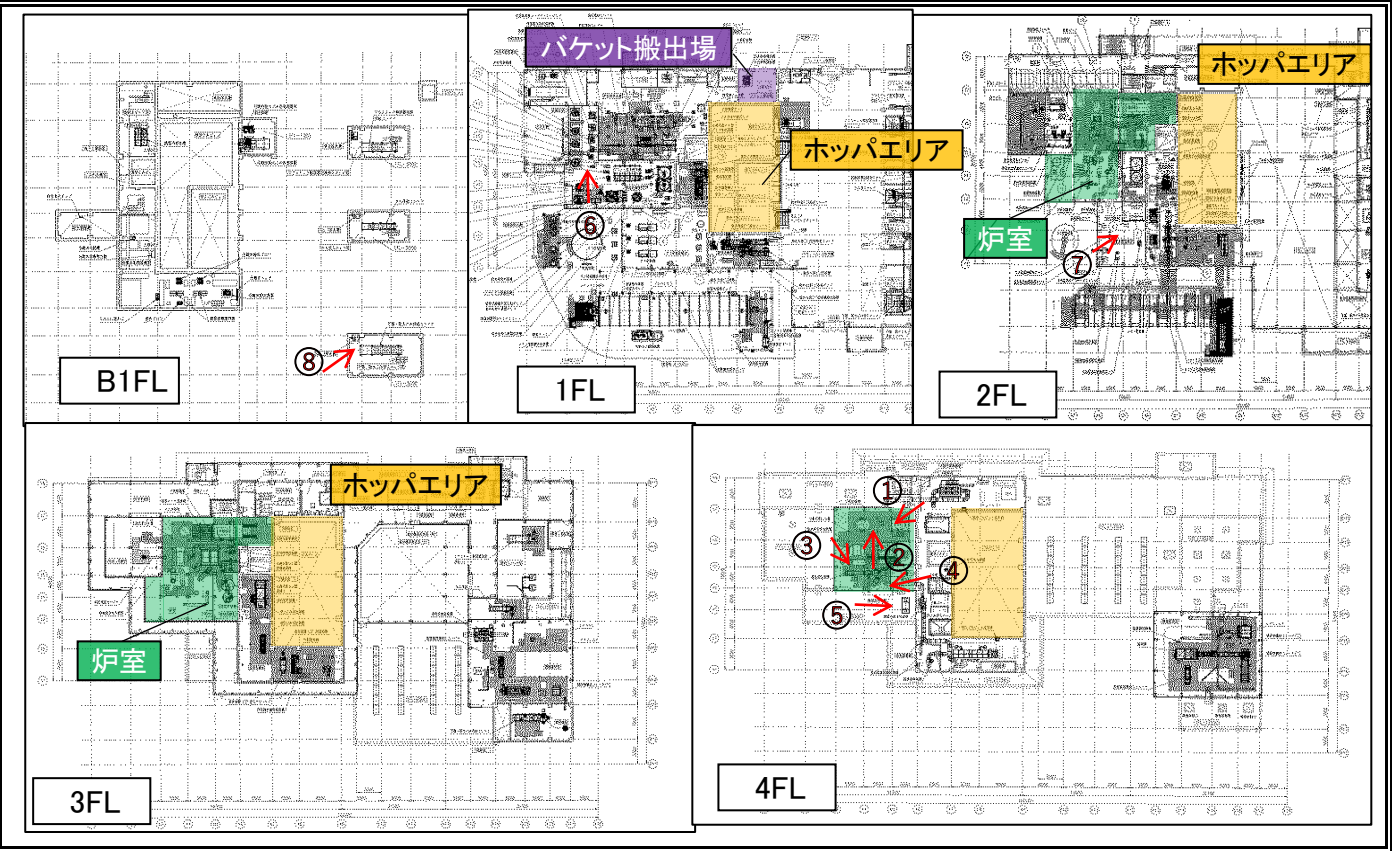

写真① 焼却炉架台・歩廊



写真② ガス冷却室・再燃焼室




写真③ 温水発生装置



写真④ 炉室ダクト



写真⑤ 機器冷却水冷却塔

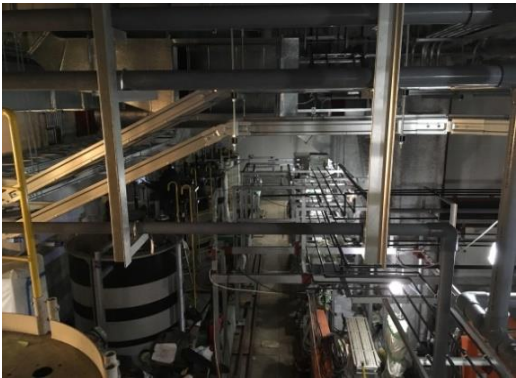

写真⑥ 配管・ケーブルラック 敷設



写真⑦ ケーブルラック 敷設



写真⑧ 配管・サポート 敷設
